



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA



Finanziato dall'Unione
europea-
NextGenerationUE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA

**ISTITUTO "SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE
VIA FILIPPO RE 8 – REGGIO EMILIA**

CRONOPROGRAMMA LAVORI PROGETTO ESECUTIVO

Il Dirigente del Servizio
Unità speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica
Ing. Azzio Gatti

IL Progettista
Arch. Giuseppe Ditarant

IL Rup
Arch. Emanuela Schiaffonati

REVISIONE		Redatto		Verificato o Validato	
Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di Manutenzione Straordinaria _RIFACIMENTO COPERTURA_ _
Istituto "Scaruffi-Levi-Tricolore" via Filippo Re, 8 Reggio Emilia

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

CANTIERE: VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (RE), REGGIO EMILIA (RE)

REGGIO EMILIA, 13/06/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO DITARANTO GIUSEPPE)

ARCHITETTO DITARANTO GIUSEPPE

CORSO GARIBALDI 26
REGGIO EMILIA
Tel.: 0522/444314 -
E-Mail: g.ditaranto@provincia.re.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	4	01/07/2022	04/07/2022
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	4	01/07/2022	04/07/2022
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	05/07/2022	07/07/2022
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	4	4	05/07/2022	08/07/2022
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	4	4	05/07/2022	08/07/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	4	4	05/07/2022	08/07/2022
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	5	5	24/10/2022	28/10/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	24/10/2022	28/10/2022
Rimozione di serramenti						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	03/08/2022	03/08/2022
[B01.061.005"""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	1	E	15	19	18/07/2022	05/08/2022
Copia di [B01.061.005"""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	1	E	20	26	29/08/2022	23/09/2022
Copia di [B01.061.005"""] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	1	E	20	26	03/10/2022	28/10/2022
Copia di Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	16/09/2022	16/09/2022
Copia di Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	21/10/2022	21/10/2022
Impermeabilizzazioni						
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	10	12	25/07/2022	05/08/2022
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1	E	6	8	25/07/2022	01/08/2022
Copia di Impermeabilizzazione di coperture	1	E	8	12	01/09/2022	12/09/2022
Copia di Impermeabilizzazione di coperture	1	E	12	16	03/10/2022	18/10/2022
Lucernari e vetrocemento						
Posa di lucernario	1	E	1	1	24/10/2022	24/10/2022
Copia di Posa di lucernario	1	E	2	2	15/09/2022	16/09/2022
Copia di Posa di lucernario	1	E	2	4	05/08/2022	08/08/2022
Manti di copertura						
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	8	10	01/08/2022	10/08/2022
Riparazione di manto di copertura in tegole	1	E	11	15	10/10/2022	24/10/2022
Copia di Posa di manto di copertura in tegole	1	E	9	13	07/09/2022	19/09/2022
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per balconi e logge	1	E	5	5	25/07/2022	29/07/2022
Formazione di rasatura per coperture	1	E	10	12	25/07/2022	05/08/2022
Copia di Formazione di rasatura per coperture	1	E	8	12	26/08/2022	06/09/2022
Copia di Copia di Formazione di rasatura per coperture	1	E	8	12	29/09/2022	10/10/2022

Tabella Analitica Gantt

Opere di lattoneria						
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	E	2	4	05/08/2022	08/08/2022
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	6	8	26/08/2022	02/09/2022
Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	7	9	29/09/2022	07/10/2022
Copia di Copia di Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	6	8	01/09/2022	08/09/2022
Perforazioni						
Perforazioni in elementi opachi	1	E	1	1	08/08/2022	08/08/2022
Rimozione di coperture e opere complementari						
Rimozione di manto di copertura in tegole	2	E	10	12	11/07/2022	22/07/2022
Rimozione di manto impermeabile	1	E	5	5	18/07/2022	22/07/2022
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	10	12	11/07/2022	22/07/2022
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole	2	E	10	15	10/08/2022	24/08/2022
Copia di Rimozione di manto impermeabile	1	E	5	7	18/08/2022	24/08/2022
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	10	15	10/08/2022	24/08/2022
Copia di Rimozione di manto di copertura in tegole	2	E	10	12	19/09/2022	30/09/2022
Copia di Rimozione di manto impermeabile	1	E	5	5	26/09/2022	30/09/2022
Copia di Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	10	12	19/09/2022	30/09/2022
Sistemi anticaduta						
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2	07/07/2022	08/07/2022
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile	1	E	2	2	07/07/2022	08/07/2022
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	1	E	2	2	07/07/2022	08/07/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2	08/08/2022	09/08/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile	1	E	2	2	08/08/2022	09/08/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	1	E	2	2	08/08/2022	09/08/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2	15/09/2022	16/09/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile	1	E	2	2	15/09/2022	16/09/2022
Copia di Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	1	E	2	2	15/09/2022	16/09/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Nuova Zona...

3) = Nuova Zona...

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


1) =


E <Nessuna impresa definita>

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

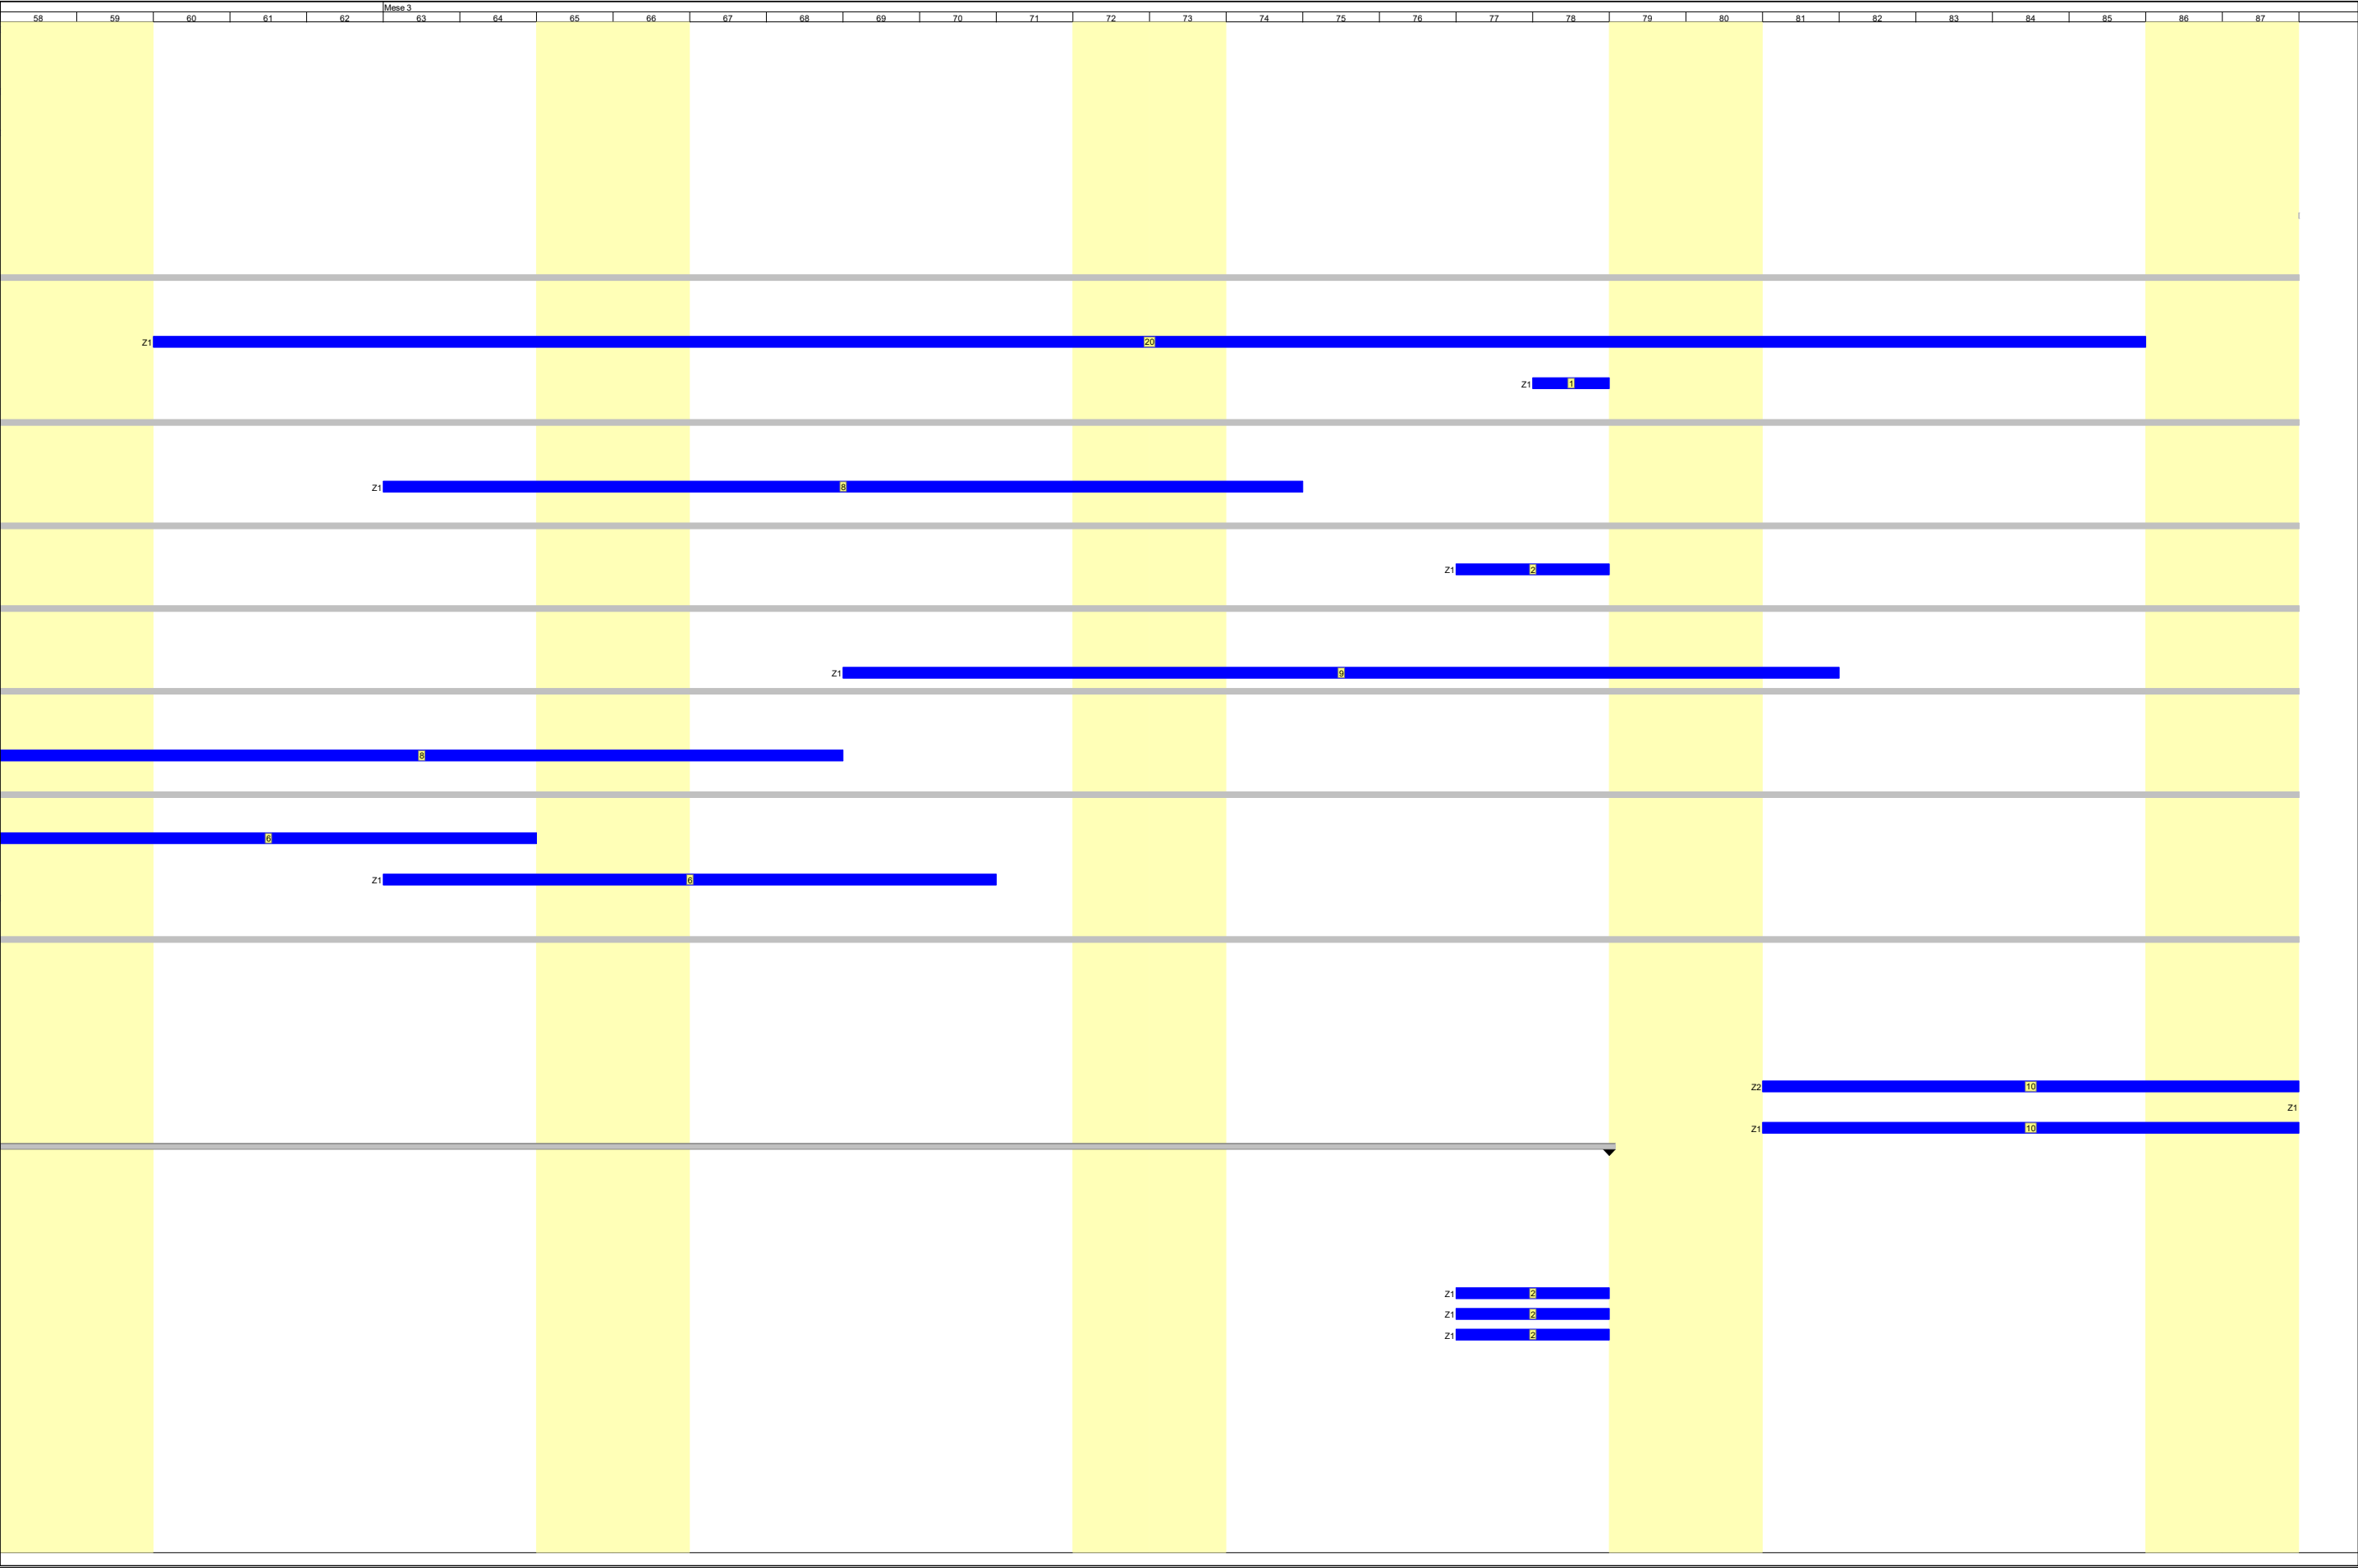

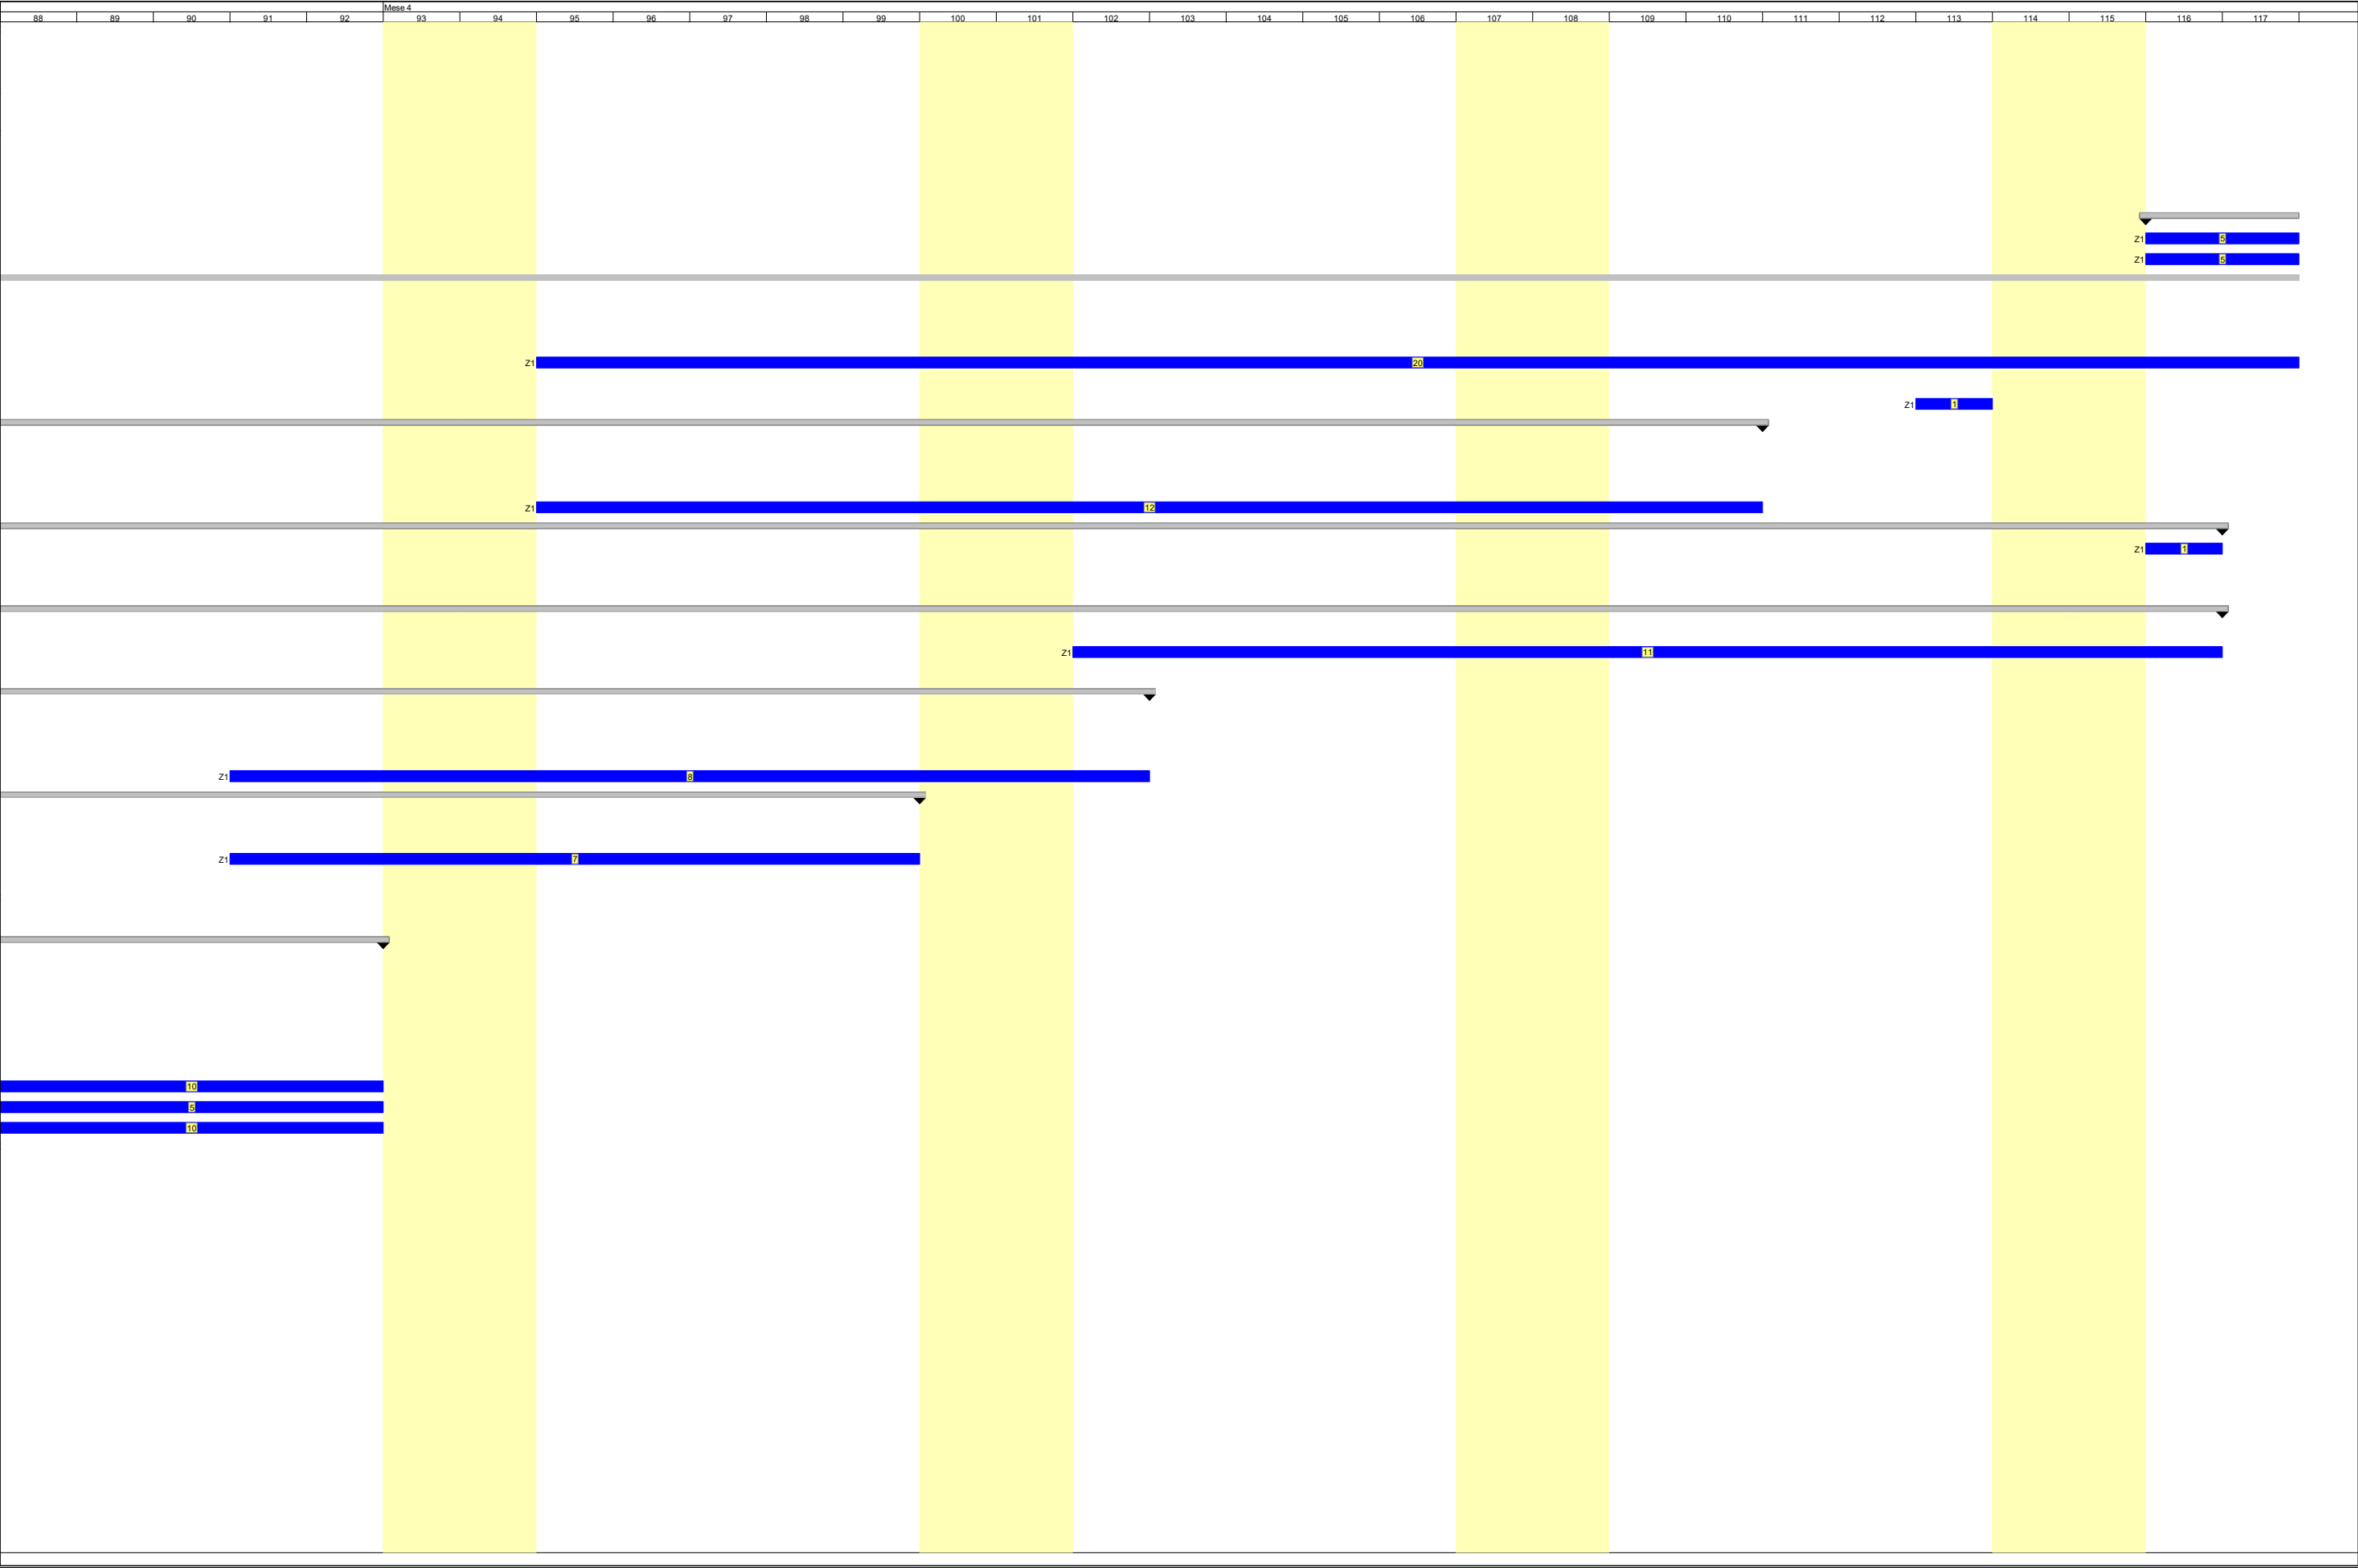

148	149	150	151	152	153	Mese 6	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	
